Ausbau Abwasserbehandlung ARA Rorbas
Bauprogramm

Stand Don 07.12.23
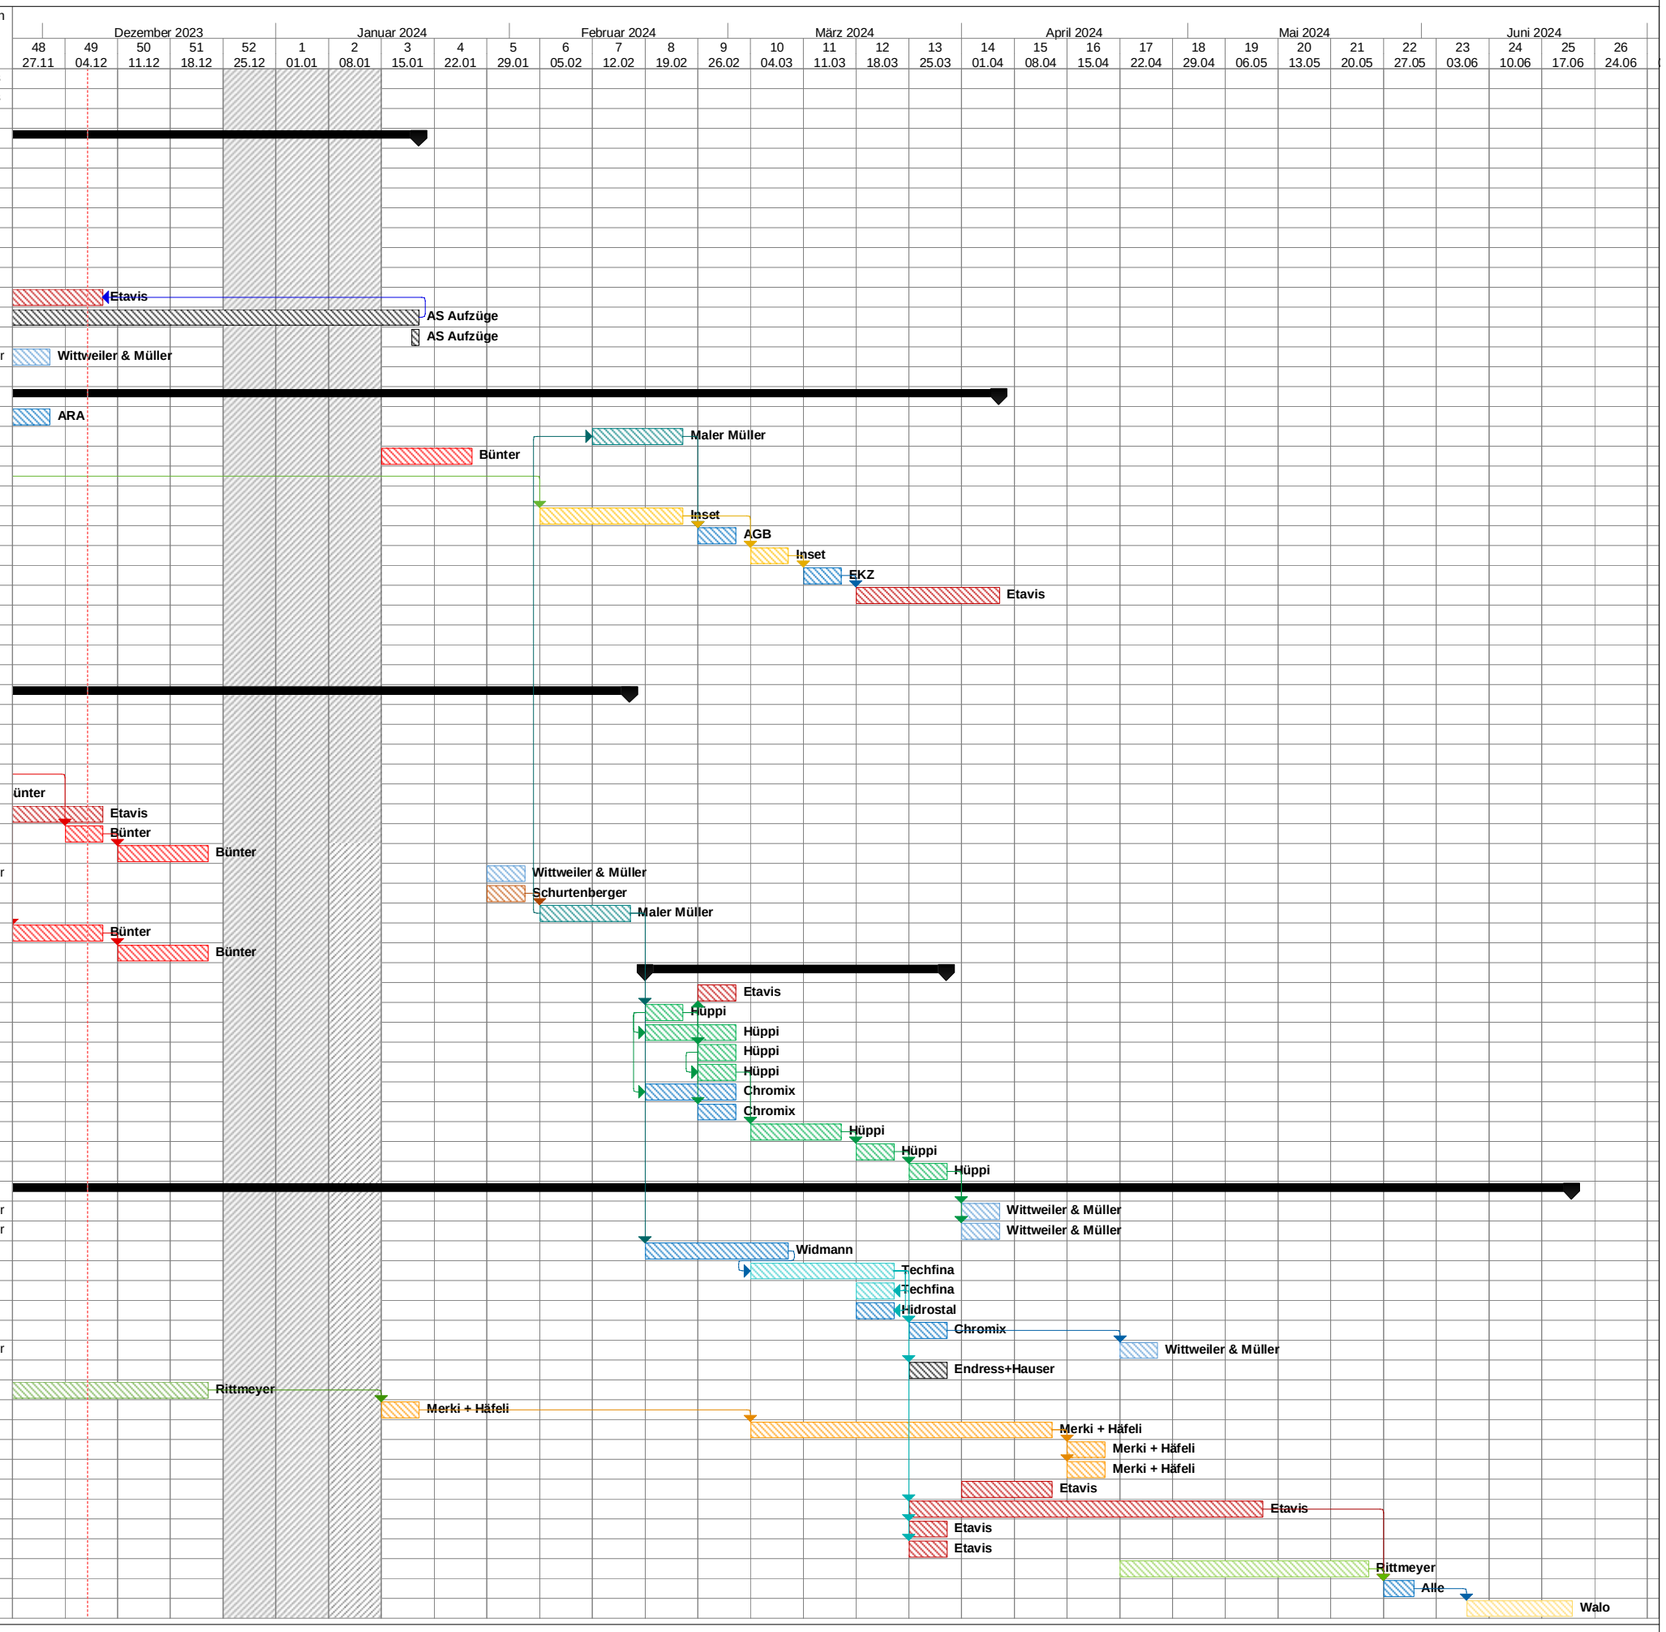
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen
1	Erteilung Baubewilligung	0 Tage	Don 30.03.23	Don 30.03.23	Gemeinde Rorbas
2	Baufreigabe	0 Tage	Fre 19.05.23	Fre 19.05.23	Gemeinde Rorbas
3	Spatenstich	0 Tage	Don 31.08.23	Don 31.08.23	
4	**Lift**	**165 Tage**	**Mon 24.04.23**	**Fre 19.01.24**	
5	**Rohbau**	**95 Tage**	**Mon 24.04.23**	**Fre 22.09.23**	
20	Erstellung Dach	15 Tage	Mon 25.09.23	Fre 13.10.23	AM Holzbau
21	Öldichter Anstrich Liftschacht + Auffangwanne	5 Tage	Mon 02.10.23	Fre 06.10.23	Walo
22	Demontage Fassadengerüst	1 Tag	Mon 16.10.23	Mon 16.10.23	Bünter
23	Abdichtung Decke Werkleitungsgang	4 Tage	Die 17.10.23	Fre 20.10.23	Bünter
24	Betonieren Zugang OG	4 Tage	Die 17.10.23	Fre 20.10.23	Bünter
25	Montagegerüst Lift	1 Tag	Mon 23.10.23	Mon 23.10.23	Bünter
26	Elektroinstallationen Lift inkl. Provisorium ab HV	10 Tage	Mon 27.11.23	Fre 08.12.23	Etavis
27	Einbau Lift	50 Tage	Mon 23.10.23	Fre 19.01.24	AS Aufzüge
28	Übergabe an ARA	1 Tag	Fre 19.01.24	Fre 19.01.24	AS Aufzüge
29	Abdeckung Pumpensumpf	5 Tage	Mon 27.11.23	Fre 01.12.23	Wittweiler & Müller
30	**Trafo**	**35 Tage**	**Mon 05.06.23**	**Fre 11.08.23**	
38	**Hauptverteilung**	**245 Tage**	**Mon 20.03.23**	**Fre 05.04.24**	
39	Räumen Werkstatt	10 Tage	Mon 20.11.23	Fre 01.12.23	ARA
40	Malerarbeiten Hauptverteilung	10 Tage	Mon 12.02.24	Fre 23.02.24	Maler Müller
41	Graben und Leerrohr zu HV	10 Tage	Mon 15.01.24	Fre 26.01.24	Bünter
42	Zeichnen Elektroschema	30 Tage	Mon 20.03.23	Fre 28.04.23	Rittmeyer
43	Freigabe Elektroschema + Bestellung Material	5 Tage	Mon 15.05.23	Fre 19.05.23	Inset
44	Bau Schränke Hauptverteilung	15 Tage	Mon 05.02.24	Fre 23.02.24	Inset
45	Vorbereiten Doppelboden	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	AGB
46	Einrichtung Hauptverteilung	5 Tage	Mon 04.03.24	Fre 08.03.24	Inset
47	Kabel Trafo zu HV	5 Tage	Mon 11.03.24	Fre 15.03.24	EKZ
48	Umhängen Unterverteilungen auf neue HV	15 Tage	Mon 18.03.24	Fre 05.04.24	Etavis
49	**Werterhalt EMSRL**	**45 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Fre 01.11.24**	
50	Elektroinstallationen Ersatz NSV Betriebsgebäude	35 Tage	Mon 02.09.24	Fre 18.10.24	Etavis
51	Montage NSV Betriebsgebäude	5 Tage	Mon 23.09.24	Fre 27.09.24	Merki + Häfeli
52	Demontage alte Hauptkommandozentrale	10 Tage	Mon 21.10.24	Fre 01.11.24	Merki + Häfeli
53	**Bau Technikraum**	**128 Tage**	**Mit 12.07.23**	**Fre 16.02.24**	
54	**Baugrube**	**43 Tage**	**Mit 12.07.23**	**Fre 29.09.23**	
64	Betonieren Bodenplatte	10 Tage	Mon 02.10.23	Fre 13.10.23	Bünter
65	Betonieren Wände inkl. Lüftungsschacht	15 Tage	Mon 09.10.23	Fre 27.10.23	Bünter
66	Betonieren Decke inkl. Schachtaufbauten	10 Tage	Mon 30.10.23	Fre 10.11.23	Bünter
67	Betonieren Treppe Notausstieg	15 Tage	Mon 06.11.23	Fre 24.11.23	Bünter
68	Fundamenterdung	50 Tage	Mon 02.10.23	Fre 08.12.23	Etavis
69	Ausbau Spriesse	5 Tage	Mon 04.12.23	Fre 08.12.23	Bünter
70	Gefällsüberzug	10 Tage	Mon 11.12.23	Fre 22.12.23	Bünter
71	Montage Aussentüre	5 Tage	Mon 29.01.24	Fre 02.02.24	Wittweiler & Müller
72	Montage Innentüren	5 Tage	Mon 29.01.24	Fre 02.02.24	Schurtenberger
73	Malerarbeiten	10 Tage	Mon 05.02.24	Fre 16.02.24	Maler Müller
74	Unterterrainabdichtung + Isolation	10 Tage	Mon 27.11.23	Fre 08.12.23	Bünter
75	Auffüllungen	10 Tage	Mon 11.12.23	Fre 22.12.23	Bünter
76	**Umgebung Technikraum**	**30 Tage**	**Mon 19.02.24**	**Fre 29.03.24**	
77	Aussenbeleuchtung	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	Etavis
78	Kabelschutzrohre, Schächte	5 Tage	Mon 19.02.24	Fre 23.02.24	Hüppi
79	Havarieschacht, Schieberschacht	10 Tage	Mon 19.02.24	Fre 01.03.24	Hüppi
80	Entwässerungsleitungen, Schächte	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	Hüppi
81	Fundation, Grobplanie	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	Hüppi
82	Umhängen Bocciahallen-Leitung	10 Tage	Mon 19.02.24	Fre 01.03.24	Chromix
83	Kellerentwässerung, Brauchwasser erdverlegt	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	Chromix
84	Randabschlüsse, Wassersteine	10 Tage	Mon 04.03.24	Fre 15.03.24	Hüppi
85	Einbau Belag	5 Tage	Mon 18.03.24	Fre 22.03.24	Hüppi
86	Umgebung	5 Tage	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24	Hüppi
87	**Ausrüstung Technikraum**	**194 Tage**	**Mon 04.09.23**	**Don 20.06.24**	
88	Geländer Treppenabgang	5 Tage	Mon 01.04.24	Fre 05.04.24	Wittweiler & Müller
89	Handlauf Treppenabgang	5 Tage	Mon 01.04.24	Fre 05.04.24	Wittweiler & Müller
90	Lüftungsinstallationen	15 Tage	Mon 19.02.24	Fre 08.03.24	Widmann
91	Montage Hydrozyklonausrüstung inkl. Pumpen	15 Tage	Mon 04.03.24	Fre 22.03.24	Techfina
92	Rohrleitung Beschickung / Überschussschlammleitung	5 Tage	Mon 18.03.24	Fre 22.03.24	Techfina
93	Kellerentwässerungspumpe	5 Tage	Mon 18.03.24	Fre 22.03.24	Hidrostal
94	Kellerentwässerung, Brauchwasser hausintern	5 Tage	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24	Chromix
95	Abdeckung Pumpensumpf	5 Tage	Mon 22.04.24	Fre 26.04.24	Wittweiler & Müller
96	Montage Messtechnik Hydrozyklon	5 Tage	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24	Endress+Hauser
97	Zeichnen Elektroschema	80 Tage	Mon 04.09.23	Fre 22.12.23	Rittmeyer
98	Bestellung Material	5 Tage	Mon 15.01.24	Fre 19.01.24	Merki + Häfeli
99	Bau Schaltschränke	30 Tage	Mon 04.03.24	Fre 12.04.24	Merki + Häfeli
100	Lieferung Schaltschränke	5 Tage	Mon 15.04.24	Fre 19.04.24	Merki + Häfeli
101	Montage Frequenzumformer Pumpen	5 Tage	Mon 15.04.24	Fre 19.04.24	Merki + Häfeli
102	Innenbeleuchtung Leitungsgang	10 Tage	Mon 01.04.24	Fre 12.04.24	Etavis
103	Elektroinstallationen Hydrozyklon	35 Tage	Mon 25.03.24	Fre 10.05.24	Etavis
104	Installation neuer LWL-Ring	5 Tage	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24	Etavis
105	Montage 19"-Racks	5 Tage	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24	Etavis
106	Ersatz PLS (Server, Alarmserver, Netzwerk etc.)	25 Tage	Mon 22.04.24	Fre 24.05.24	Rittmeyer
107	Inbetriebnahme Hydrozyklon + Lüftung	4 Tage	Mon 27.05.24	Don 30.05.24	Alle
108	Bodenbeschichtung	10 Tage	Fre 07.06.24	Don 20.06.24	Walo
